

縣立南投殯儀館新建工程採購廉政平臺




第1次聯繫會議

施工廠商簡報

品信良營造股份有限公司

中華民國112年 11月 21 日

報告人：彭文賢

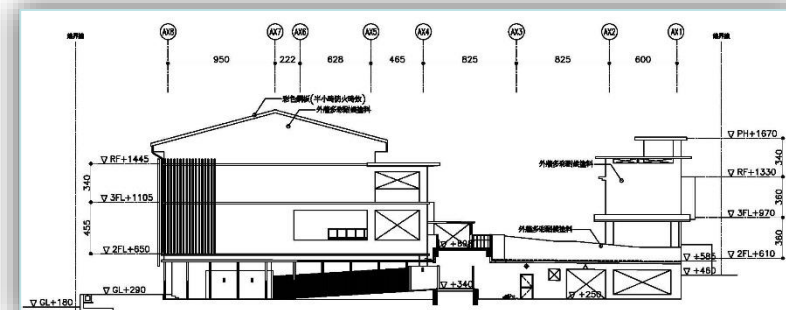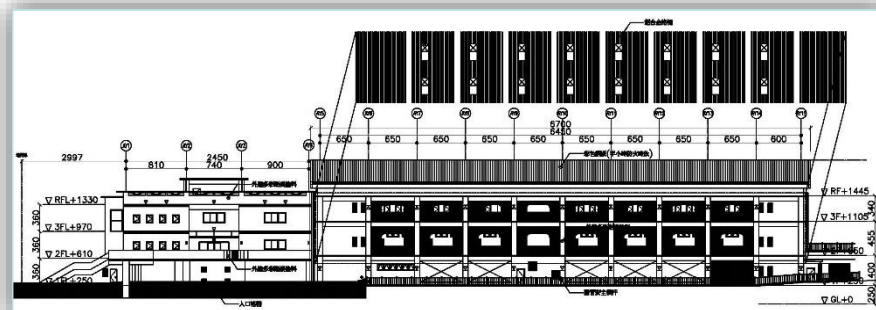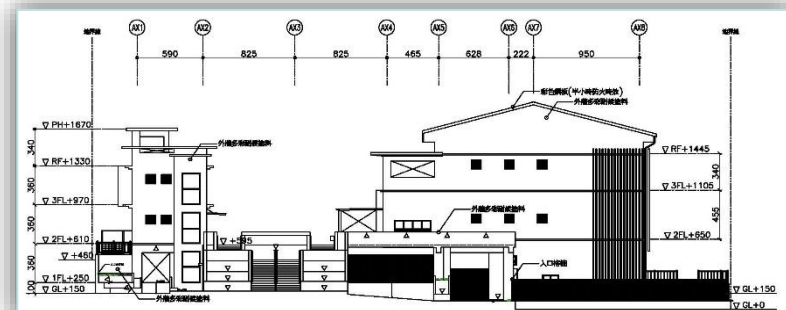

簡報大綱

01

工程實績

02

工程進度

03

職業安全衛生管理情形

01

工程實績

工 程 名 稱	業 主	完工日期	金額 (千元)
109年度國民小學建置校園特色遊戲場工程	南投縣埔里鎮埔里國民小學	111/1/10	1750
提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫-投85線0K+000~9K+640提升道路品質工程	南投縣政府工務處 土木工程科	110/12/7	40521.4
提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫-131線22K+400~31K+900提升道路品質工程	南投縣政府工務處 土木工程科	110/11/25	32278.3
109提升道路品質計畫(內政部)第六次競爭型-鹿谷鄉興產路(杉林溪段)第二期工程	南投縣政府工務處 土木工程科	110/12/27	35867.1
南投縣埔里鎮中華路、仁愛路與和平東路等雨水下水道後續工程	南投縣政府工務處 下水道科	111/10/6	31890.8
仁愛鄉發祥村瑞岩部落聯絡道路改善工程	南投縣政府原住民族行政局	110/8/23	9180
南投縣政府加速整建受損橋梁無名橋(寮-130)、永順橋及永豐橋(3)等3座橋梁改建工程	南投縣政府工務處 土	木工程科 110/9/3	17746.8

02


工程進度

項目	內容
進度	預定進度：17.96%、實際進度：18.86%，超前+0.90%
施工現況	(1)A區大體中心 屋突結構體施作 (2)B區禮儀中心 1樓結構體施作 (3)水電配管


主辦機關:南投縣政府
設計單位:劉宇建築師事務所
承攬廠商:品信良營造股份有限公司
施工地點:南投縣南投市

109年度南投縣立殯儀館新建工程

開工日期:112年02月01日
預定竣工日期:114年04月20日
次要線:
核准展延天數:10天
展延竣工日期:114年04月30日
契約工期:810日曆天
版次:第二版(第1次修正)

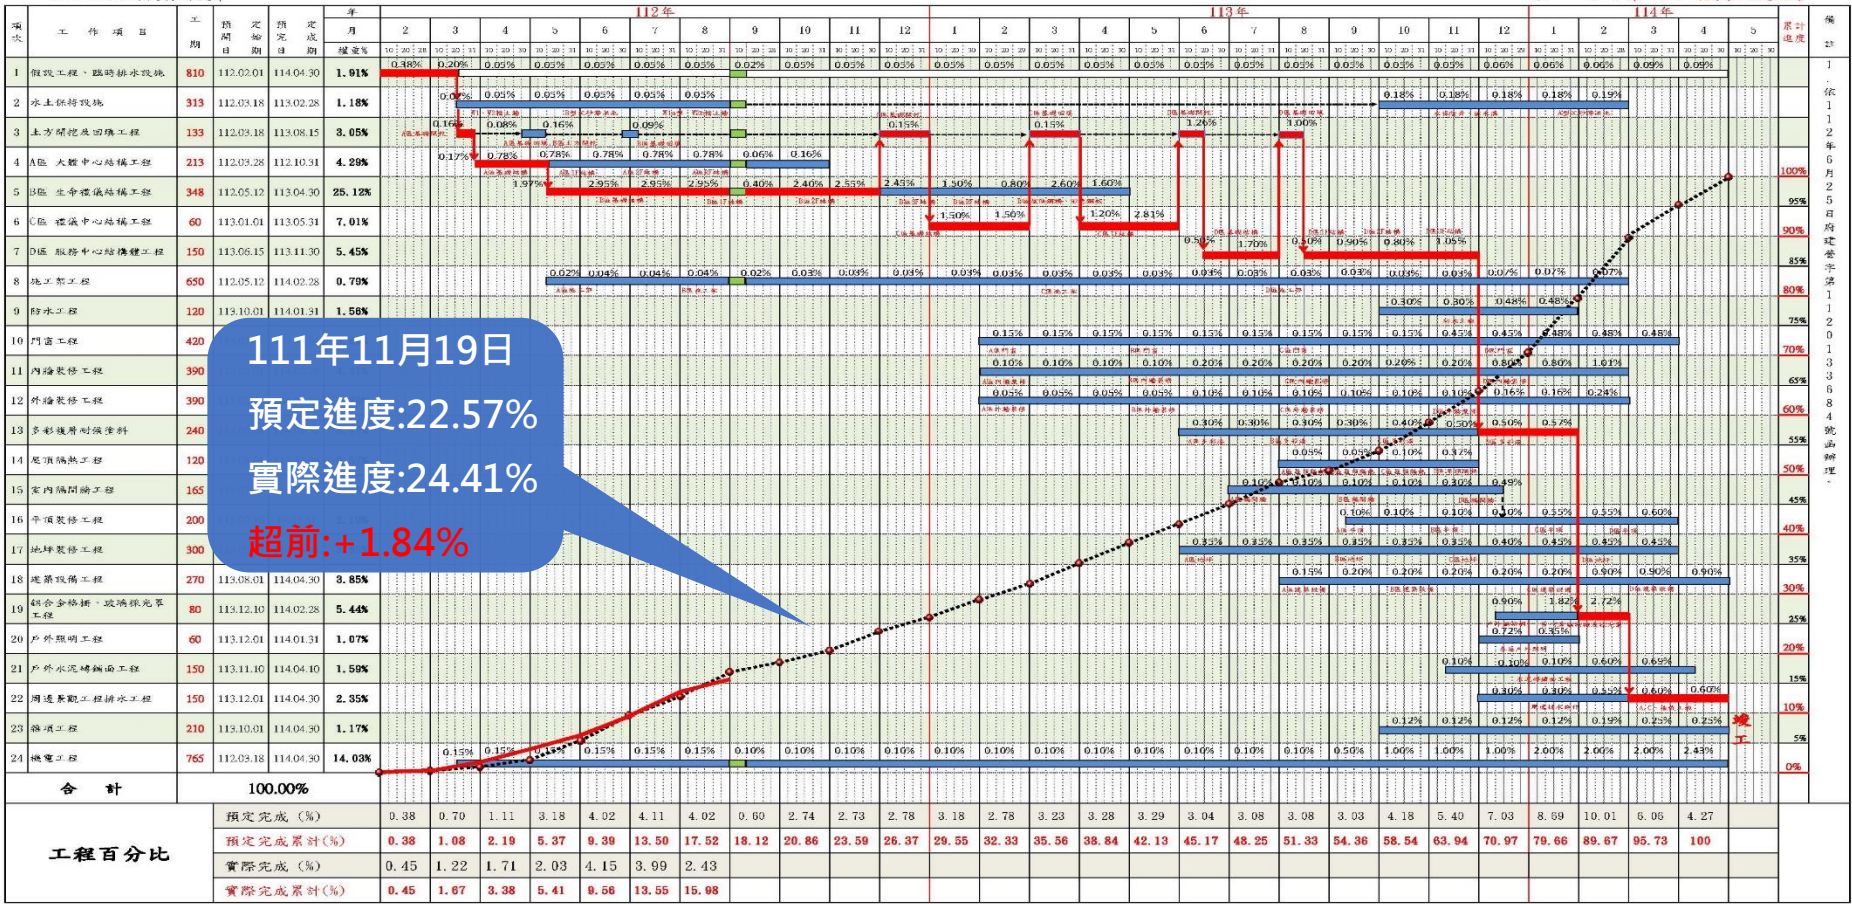

全區施作流程：

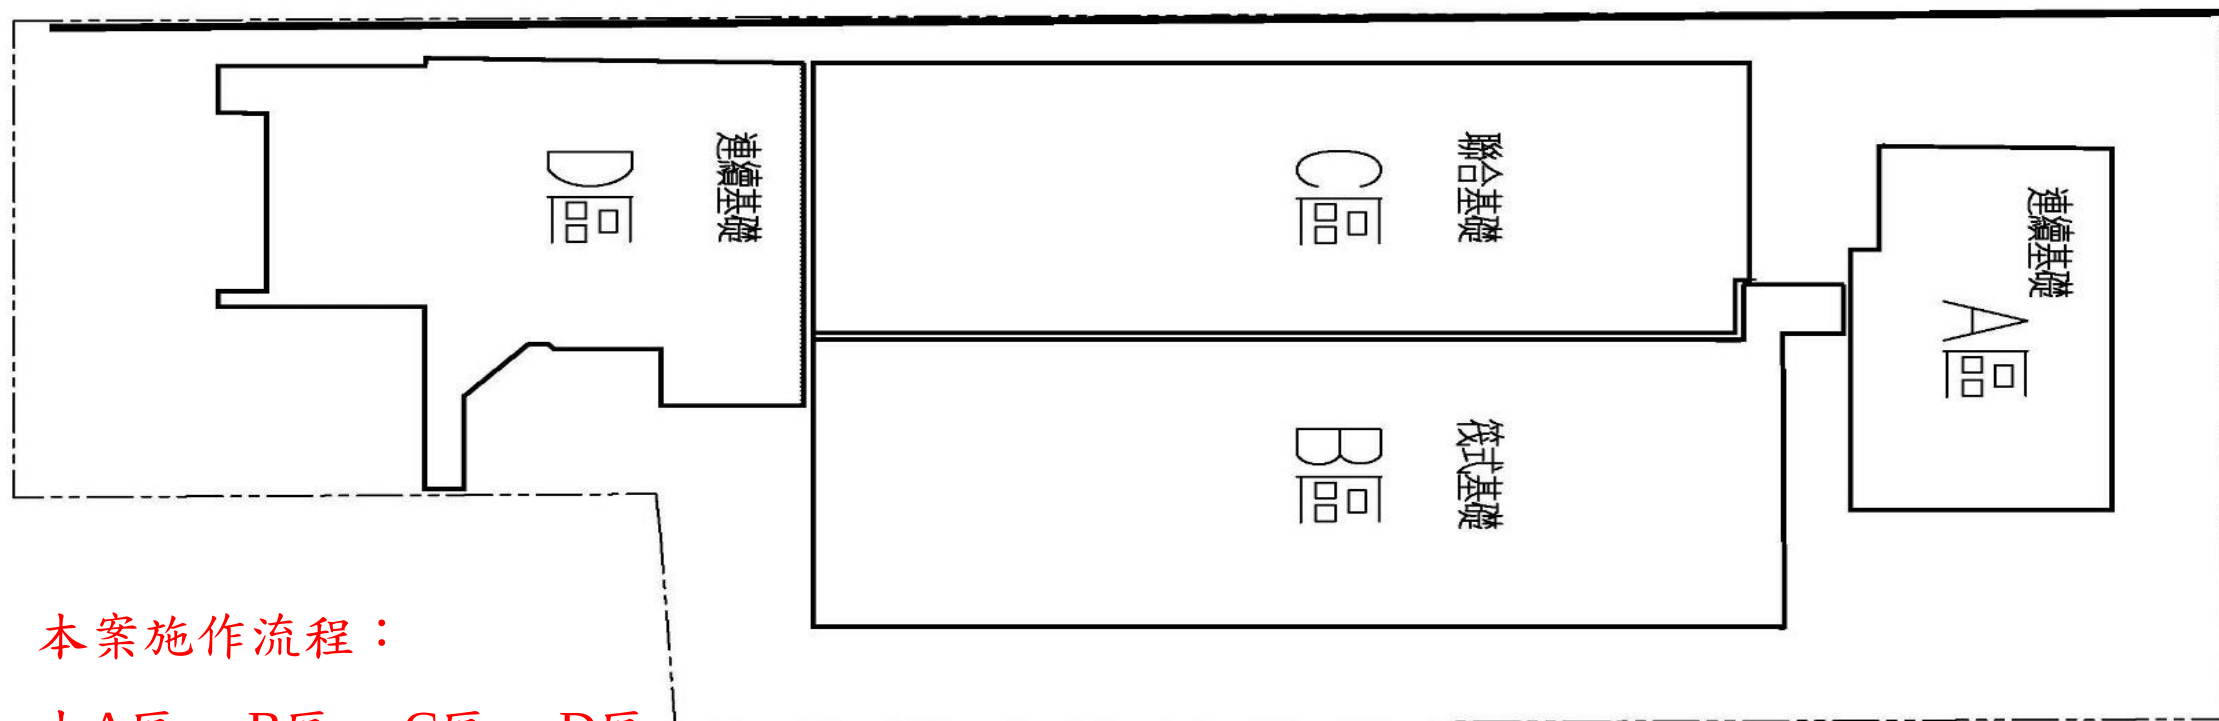

本案施作流程：

由A區→B區→C區→D區

逐區施作

A區：結構體全部完成(2樓構造物)

B區：1FL結構體完成(3樓構造物)

C區：基礎結構體完成(1樓構造物)

D區：暫未施作(3樓構造物)

一. A區施作工項過程現況情形





5.1FL柱、牆模板組立




6.1FL樑、版鋼筋綁紮



7.1FL結構體完成



8.2FL柱、牆模板組立

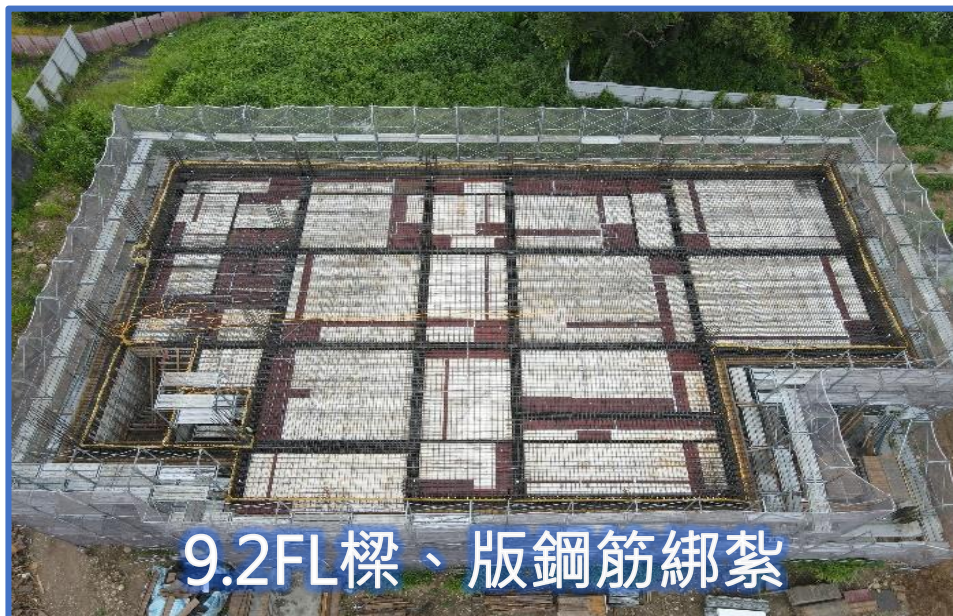

9.2FL樑、版鋼筋綁紮



10.2FL結構體完成





11.RFL結構體模板組立



12.A區結構體完成

二. B區施作工項過程現況情形

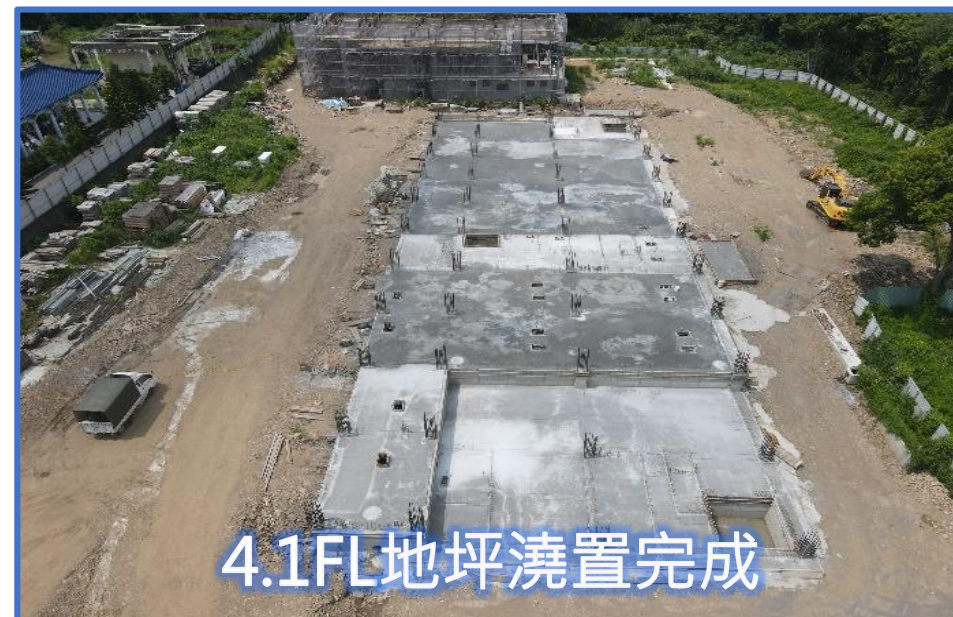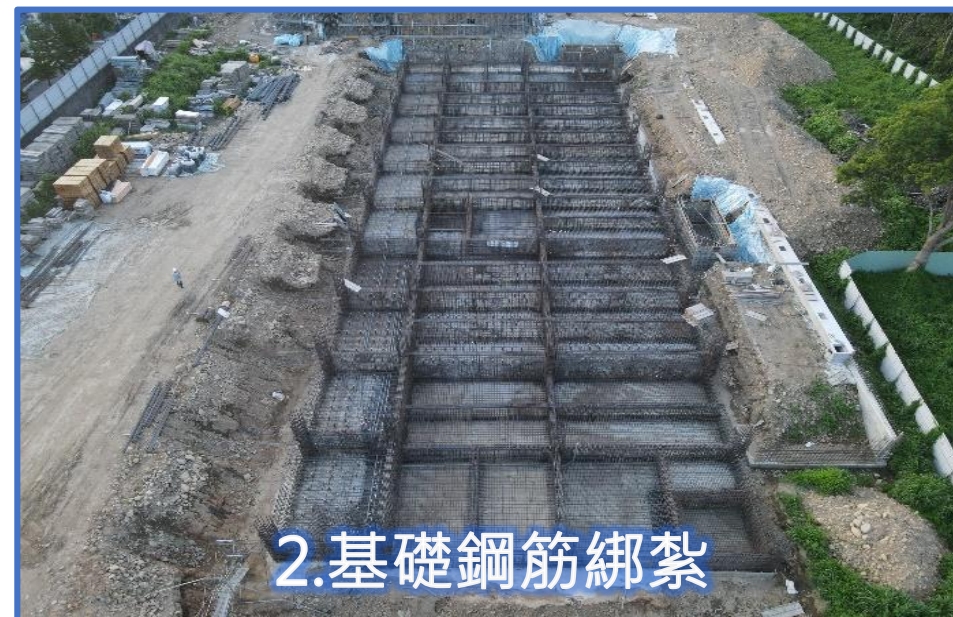



5.1FL柱、牆模板組立



6.1FL梁、版模板組立




7.1FL梁、版鋼筋綁紮



8.1FL結構體完成

三. C區施作工項過程現況情形

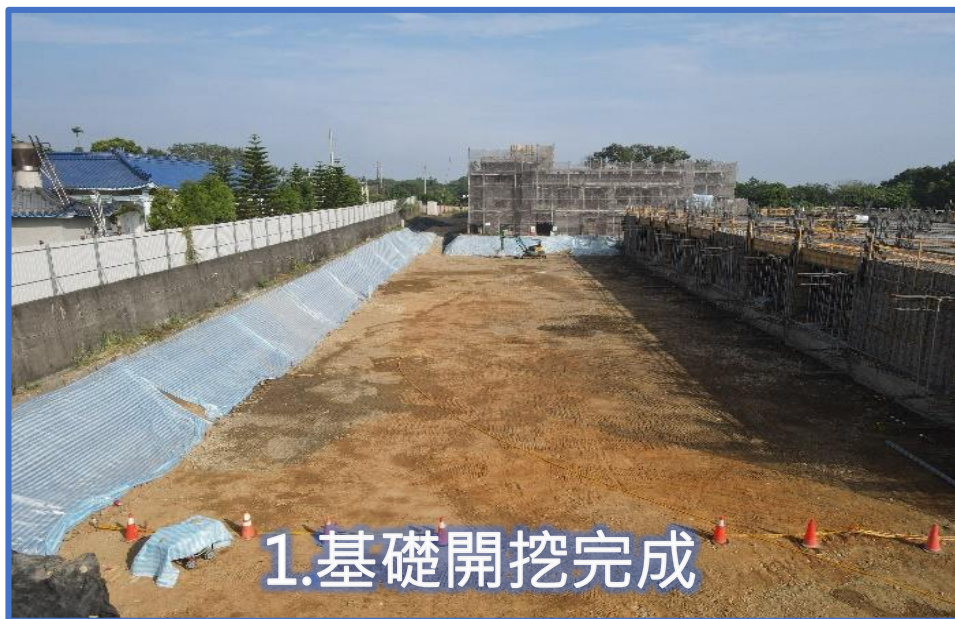

03

職業安全衛生管理情形

安全衛生管理員：

9

-13-


檢查人員： 

說明：1、本表提供廠商每日施工前辦理安全衛生自主檢查使用，表列為每日必檢查之項目，由檢查人員確實檢查簽證，並回報工地主任。
2、檢查人員應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員擔任，前述檢查缺失應立即改善完成，未檢查合格者，廠商不得使其進場施工。
3、本表得依工程個案需求自行增列其他檢查項目。

工地安全檢查項目

- 每日一般職安檢查
- 宣導並確認勞工確實配戴個人防護具
- 檢查現場安全設施
(各作業之安全檢查表)
- 教育訓練

項次	實施項目	週期 (頻率)	檢查內容/人員	檢查 次數	合格 次數	不合格 次數
1	一般安全衛生檢查表	每日	作業檢點(安衛管理人員)	173	173	0
2	電氣作業安全檢查表	每週定期檢查	依作業項目檢查 (作業人員)	50	50	0
3	施工架安全檢查表	每週	定期檢查 作業主管檢點	16	16	0
		每當惡劣氣候襲擊後、每次停工復工前及地震後				
4	露天開挖作業安全檢查表	作業前	作業主管檢點	08	08	0
5	模板作業安全檢查表	作業前	作業主管檢點	83	83	0
.....						
9	鋼筋作業安全檢查表	作業前	作業主管檢點	62	62	0

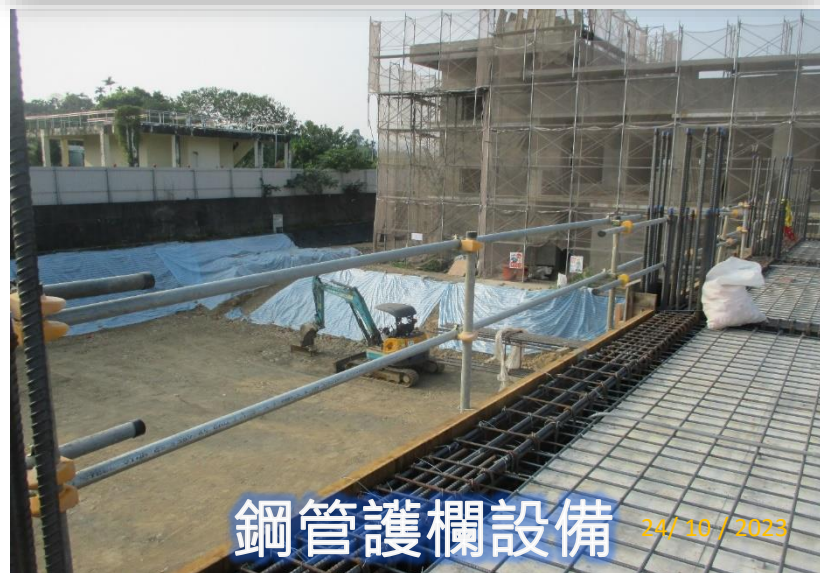





熱危害分級表

04/08/2023

空氣品質監測看板

溫度	31.7	°C
濕度	71	%
PM _{2.5}	5	µg/m ³
PM ₁₀	11	µg/m ³

多功能監測看板

04/08/2023

飲水機

礦泉水



熱危害等級旗幟

11/09/2023

休息區

人員休息區

11/09/2023

進入工區前**危害告知**

- 1.工區內可能之危害有：墜落、滾落、割傷、擦傷、跌倒。
- 2.進入工區應正確配戴安全帽並扣上顎扣。
- 3.工地內安衛措施嚴禁拆除或移動。
- 4.工區內護欄禁止攀爬及跨越。
- 5.電源開關及電源線不得任意操作及接觸。
- 6.請遵循相關工作人員引導。
- 7.施工機械之作業半徑範圍內禁止人員靠近。

工地現場查核路線順序

